



**องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก**  
**อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์**

งานควบคุมงานก่อสร้าง

ก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกหนองอ่อม - ทางหลวงแผ่นดิน 202  
หมู่ที่ 1 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนตุลาคม 2565

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ที่ บร 82303/๑๗๕

วันที่ 28 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้าง

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานประจำเดือน ตุลาคม 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกหนองอ่อม - ทางหลวงแผ่นดิน 202 สถานี หมู่ที่ 1 ตำบลหลายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ยกระดับถนนดิน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 700 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,450 ลบ.ม. สัญญาจ้างเลขที่ 055/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 แล้วเสร็จวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รวม 90 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ - รวม - วัน ค่าก่อสร้าง 498,500.00 บาท ค่าปรับวันละ 494.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก ผู้รับจ้าง หจก.หลายโคกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

### คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- นางสมพร เต๋อไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0	ยังไม่ทำงาน	59 วัน (65.56 %)	1	-	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

(นางสมพร เต๋อไธสง)




# ที่ตั้งโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน

สถานที่ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน  
บ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 ตำบลทราย  
โตก อำเภอบางบาล จังหวัดปทุมธานี

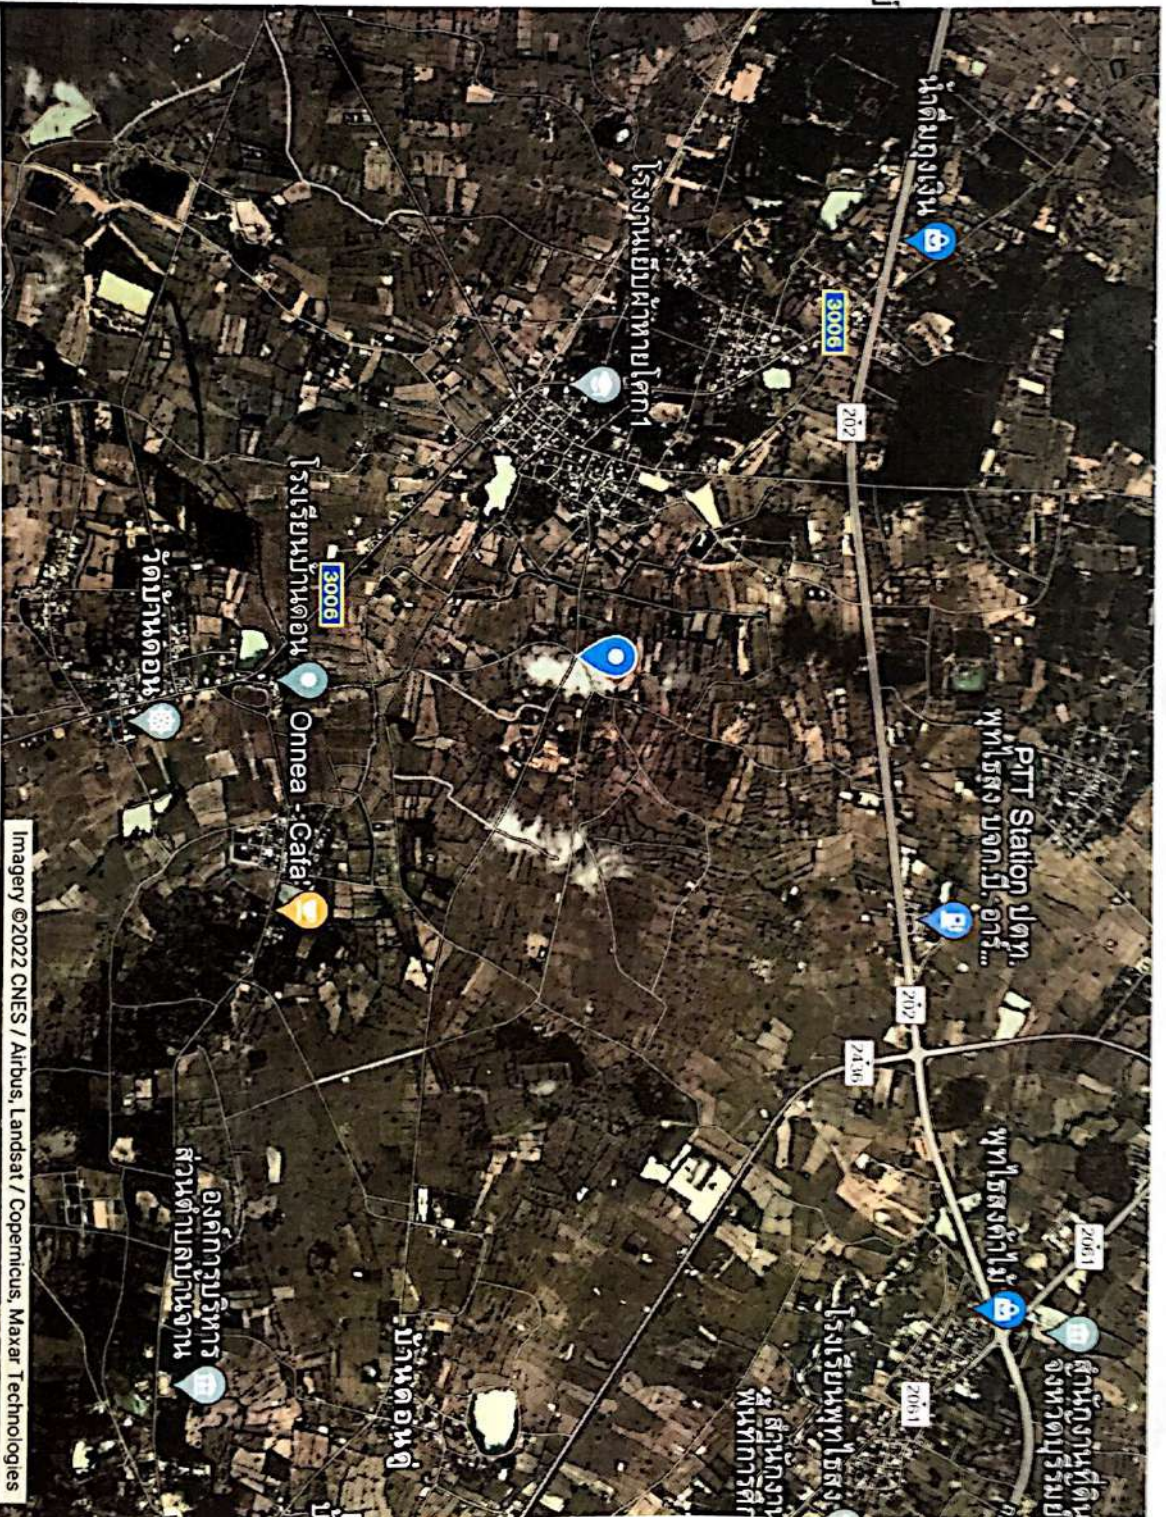



# 1 ข้อมูลเกี่ยวกับงาน

## 1.1 ผู้ดำเนินการ

ผู้ว่าจ้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
ผู้ออกแบบ	คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
ผู้รับจ้าง	หจก.หายโศกก่อสร้าง
สถานที่ตั้ง	เลขที่ 50 หมู่ 14 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

## 1.2 สัญญาจ้าง

ชื่อสัญญา	ก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกหนองอ่อม - ทางหลวงแผ่นดิน 202	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	
สัญญาจ้างเลขที่	055/2565	ลงวันที่ 30 กันยายน 2565
เริ่มสัญญาจ้าง	1 ตุลาคม 2565	
สิ้นสุดสัญญาจ้าง	29 ธันวาคม 2565	
ระยะเวลาก่อสร้างรวม	90	วัน
จำนวนงวดงานตามสัญญา	1	งวด
ต่อสัญญาถึงวันที่	-	
รวมระยะเวลาที่ต่อสัญญา	-	
ราคาค่อก่อสร้าง	498,500.00	บาท
ค่าปรับวันละ	494.00	บาท

## 1.3 ลักษณะและขอบเขตงาน

งานก่อสร้าง	ก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกหนองอ่อม - ทางหลวงแผ่นดิน 202 ยกระดับถนนดิน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 700 เมตร ถมดิน
-------------	---

## 1.4 คณะกรรมการตรวจการจ้าง

1	นายวรงค์ วกิจ	ประธานกรรมการ
2	นางสาววรรณภา ชีพไธสง	กรรมการ
3	นางสมพร เตื่อไธสง	กรรมการ

## 1.5 ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

1	นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง	ผู้ควบคุมงาน
---	-----------------------	--------------

## 1.6 ผู้แทนผู้ว่าจ้าง

นายสุวิทย์ ผิวขาว



3 รายละเอียดวงงานและการตรวจรับงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

งาน งวดที่	จำนวนเงิน (บาท)	วัน เดือน ปี ที่แล้วเสร็จ	วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ	หมายเหตุ

หมายเหตุ

#### 4 ผลการทดสอบ/ขออนุมัติใช้วัสดุ

##### 4.1 การทดสอบวัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

รายการทดสอบวัสดุ	จำนวนตัวอย่าง	วันที่ทดสอบ	หน่วยงานที่ทดสอบ	ตำแหน่งที่ทดสอบ	ผลการทดสอบ

##### 4.2 การขออนุมัติใช้วัสดุ

รายการที่ขออนุมัติ	วันที่ขออนุมัติ	ผู้พิจารณา	ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

5 ปัญหา/อุปสรรคในการก่อสร้าง

ไม่มี

มี รายละเอียดดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ที่	ปัญหา - อุปสรรค - การแก้ไข	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน	<input type="checkbox"/> แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> รายงานประชาชน
2	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน	<input type="checkbox"/> แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> รายงานประชาชน
3	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน	<input type="checkbox"/> แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> รายงานประชาชน
4	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน	<input type="checkbox"/> แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> รายงานประชาชน

6 สรุปผลการดำเนินงานถึงปัจจุบัน

6.1 ผลการก่อสร้างประจำเดือน	0.00	%	
6.2 ผลงานก่อสร้างรวมทั้งปัจจุบัน	0.00	%	
6.3 ผลงานก่อสร้างตามแผน	0.00	%	
6.4 ผลการก่อสร้าง			
<input type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงาน	0.00	%	
6.5 ระยะเวลาก่อสร้างคงเหลือ	59	วัน	
6.6 งานก่อสร้างแล้วเสร็จรวม	-	งวด	คิดเป็นมูลค่างาน - %

(ลงชื่อ)   
(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร 88203/๖๓๓๗ วันที่ 28 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 178(4)

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ 218/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งข้าพเจ้า เป็นผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 055/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 ว่าจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง ทำงานก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกหนองอ่อม - ทางหลวงแผ่นดิน 202 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดเริ่มทำงานจ้างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และกำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ค่างาน 498,500.00.- บาท(-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) นั้น

ผู้ควบคุมงานเมื่อได้รับทราบคำสั่งฯ/รายละเอียดของสัญญา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 และได้เข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ปรากฏว่าผู้รับจ้าง

[  ] ยังไม่เข้าดำเนินการ ณ สถานที่ก่อสร้าง

[  ] เข้าดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ .....

(  ) เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา

(  ) เกินข้อกำหนดของสัญญา จำนวน.....วัน

โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

.....

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

(นางสมพร เตื้อไธสง)



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ที่ บร 88203/ว๖๑๘

วันที่ 7 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกถนนอ้อม - ทางหลวงแผ่นดิน 202 สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหลายโคก อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ยกระดับถนนดิน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 700 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,450 ลบ.ม. สัญญาจ้างเลขที่ 055/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 แล้วเสร็จวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รวม 90 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ - รวม  
- วัน ค่าก่อสร้าง 498,500.00 บาท ค่าปรับวันละ 494.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก ผู้รับจ้าง หจก.หลายโคกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

### คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตื่อไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0	ยังไม่ทำงาน	83 วัน (92.22 %)	1	-	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

.....

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการฯ

(นางสมพร เตื่อไธสง)



วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
1 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
2 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
3 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
4 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
5 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
6 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
7 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่	1	2	3	4	5	6	7
หัวหน้าคนงาน/ช่าง							
กรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	1	2	3	4	5	6	7
แจ่มใส							
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	1	2	3	4	5	6	7
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รวม	0	0	0	0	0	0	0

  
 (นายฐิติพงศ์ แคว้นไชสง)  
 ผู้ควบคุมงาน



ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ที่

บร 88203/๑๖๙

วันที่ 14 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกหนองอุ่ม - ทางหลวงแผ่นดิน 202 สถานี หมู่ที่ 1 ตำบลหลายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ยกระดับถนนดิน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 700 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,450 ลบ.ม. สัญญาจ้างเลขที่ 055/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 แล้วเสร็จวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รวม 90 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ - รวม - วัน ค่าก่อสร้าง 498,500.00 บาท ค่าปรับวันละ 494.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก ผู้รับจ้าง หจก.หลายโคกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

### คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตื่อไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0	ยังไม่ทำงาน	76 วัน (84.44 %)	1	-	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายรัฐติพงษ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสมพร เตื่อไธสง)

กรรมการฯ



วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
8 ตุลาคม 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
9 ตุลาคม 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
10 ตุลาคม 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
11 ตุลาคม 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
12 ตุลาคม 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
13 ตุลาคม 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
14 ตุลาคม 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก

วันที่	8	9	10	11	12	13	14
หัวหน้าคนงาน/ช่าง							
กรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	8	9	10	11	12	13	14
แจ่มใส							
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	8	9	10	11	12	13	14
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รวม	0	0	0	0	0	0	0



(นายรัฐติพงษ์ แคว้นไชสง)

ผู้ควบคุมงาน



(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ที่ บร 88203 / ๑๗๖

วันที่ 21 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 3 สัปดาห์ที่ 3/2565 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกหนองอุ่ม - ทางหลวงแผ่นดิน 202 สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ยกระดับถนนดิน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 700 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,450 ลบ.ม. สัญญาจ้างเลขที่ 055/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 แล้วเสร็จวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รวม 90 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ - รวม - วัน ค่าก่อสร้าง 498,500.00 บาท ค่าปรับวันละ 494.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก ผู้รับจ้าง หจก.ห้วยโคกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

### คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตือไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0.00	ยังไม่ทำงาน	69 วัน (76.67 %)	1	-	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการฯ

(นางสมพร เตือไธสง)





วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
15 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
16 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
17 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
18 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
19 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
20 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
21 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่	15	16	17	18	19	20	21
หัวหน้าคนงาน/ช่างกรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	15	16	17	18	19	20	21
แจ่มใส							
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							


บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	15	16	17	18	19	20	21
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รวม	0	0	0	0	0	0	0



(นายฐิติพงศ์ แคว้นโฮตง)

ผู้ควบคุมงาน



ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร 88203 / ๑๗๖

วันที่ 28 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 4 สัปดาห์ที่ 4/2565 ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกหนองอู่ม - ทางหลวงแผ่นดิน 202 สถานี หมู่ที่ 1 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ยกระดับถนนดิน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 700 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,450 ลบ.ม. สัญญาจ้างเลขที่ 055/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 แล้วเสร็จวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รวม 90 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ - รวม

- วัน ค่าก่อสร้าง 498,500.00 บาท ค่าปรับวันละ 494.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

### คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสาวสมพร เตือไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0	ยังไม่ทำงาน	62 วัน (68.89 %)	1	-	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

.....

(ลงชื่อ)

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสมพร เตือไธสง)

กรรมการฯ





วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
22 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
23 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
24 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
25 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
26 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
27 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
28 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

วันที่	22	23	24	25	26	27	28
หัวหน้าคนงานช่าง							
กรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	22	23	24	25	26	27	28
แจ่มใส							
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	22	23	24	25	26	27	28
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รวม	0	0	0	0	0	0	0



(นายจิติพงษ์ แคว้นไชสง)

ผู้ควบคุมงาน



(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ที่ บร 88203/๒๗๑๐ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

เรื่อง รายงานวันถึงกำหนดส่งมอบงานของผู้รับจ้างตามข้อกำหนดของสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 178(4)

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก ที่ 218/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 055/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 ว่าจ้าง หจก.หลายโคกก่อสร้างทำงานก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกหนองอ่อม - ทางหลวงแผ่นดิน 202 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหลายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดเริ่มทำงานจ้างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และกำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ค่างาน 498,500.00.- บาท(-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างและส่งมอบงวดงานจ้างแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ดำเนินการแล้วเสร็จตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 29 ธันวาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายจิตติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

(นางสมพร เตือไธสง)



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร 88203/๕๒๑

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 5 สัปดาห์ที่ 5/2561 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกหนองอ่อม - ทางหลวงแผ่นดิน 202  
สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ยกระดับถนนดิน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 700  
เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,450 ลบ.ม. สัญญาจ้างเลขที่ 055/2565 ลงวันที่ 30  
กันยายน 2565 แล้วเสร็จวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รวม 90 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ - รวม - วัน  
ค่าก่อสร้าง 498,500.00 บาท ค่าปรับวันละ 494.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ผู้รับจ้าง หจก.  
หายโศกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

### คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตื่อไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
20	เร็ว	55 วัน (68.89 %)	1	-	-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการฯ (ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสมพร เตื่อไธสง)

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
29 ตุลาคม 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เข้าทำการขุดป่าถางตอพื้นที่ก่อสร้างพร้อมปรับเกรดผิวจราจรถนนดิน	
30 ตุลาคม 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เข้าทำการขุดป่าถางตอพื้นที่ก่อสร้างพร้อมปรับเกรดผิวจราจรถนนดิน	
31 ตุลาคม 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เข้าทำการขุดป่าถางตอพื้นที่ก่อสร้างพร้อมปรับเกรดผิวจราจรถนนดิน	
1 พฤศจิกายน 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
2 พฤศจิกายน 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
3 พฤศจิกายน 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
4 พฤศจิกายน 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

## บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

วันที่	29	30	31	1	2	3	4
หัวหน้าคนงาน/ช่าง	1	1	1				
ขับรถ,กรรมกร	3	3	3				
รวม	4	4	4	0	0	0	0

## ตารางสภาพอากาศ

วันที่	29	30	31	1	2	3	4	
แจ่มใส	√	√	√	√	√	√	√	
ฝนตก	เล็กน้อย							
	ปานกลาง							
ฝนตกเวลา		หนัก						

## บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	29	30	31	1	2	3	4
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole	1	1	1				
รถเกรดเดอร์	1	1	1				
รถแทรกเตอร์	1	1	1				
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ							
รถเทเลอร์							
เครื่องมืองานปูน							
รวม	3	3	3	0	0	0	0



(นายรัฐพิงค์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน



(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	ก่อสร้างยกระดับถนนดิน	100.00	-	20.00	20.00	20.00
	<b>รวม</b>	<b>100.00</b>	<b>รวม</b>			<b>20.00</b>

ปัญหา - อุปสรรค

 ไม่มี มี ดังนี้





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร 88203 *สขบ* วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 6 สัปดาห์ที่ 6/2565 ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกหนองอ่อม - ทางหลวงแผ่นดิน 202 สถานี หมู่ที่ 1 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ยกระดับถนนดิน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 700 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,450 ลบ.ม. สัญญาจ้างเลขที่ 055/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 แล้วเสร็จวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รวม 90 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ - รวม - วัน ค่าก่อสร้าง 498,500.00 บาท ค่าปรับวันละ 494.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

### คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตื้อไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
20	ยังไม่ทำงาน	48 วัน (53.33 %)	1	-	-	-	-
					-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายจตุตพงษ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

(นางสมพร เตื้อไธสง)

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	ก่อสร้างยกระดับถนนดิน	100.00	20.00	-	20.00	20.00
รวม		100.00	รวม			20.00

ปัญหา - อุปสรรค

- ไม่มี
- มี ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
5 พฤศจิกายน 2565	[V] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
6 พฤศจิกายน 2565	[V] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
7 พฤศจิกายน 2565	[V] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
8 พฤศจิกายน 2565	[V] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
9 พฤศจิกายน 2565	[V] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
10 พฤศจิกายน 2565	[V] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
11 พฤศจิกายน 2565	[V] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่	5	6	7	8	9	10	11
หัวหน้าคนงาน/ช่าง							
กรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	5	6	7	8	9	10	11
แจ่มใส	√	√	√	√	√	√	√
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	5	6	7	8	9	10	11
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole							
รถเกรดเตอร์							
รถแทรกเตอร์							
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ							
รถเทเลอร์							
เครื่องมืองานปูน							
รวม	0	0	0	0	0	0	0



(นายรัฐพิงค์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน



(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ที่ บร 88203/๒๒๓๓ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 7 สัปดาห์ที่ 7/2565 ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกหนองอ่อม - ทางหลวงแผ่นดิน 202 สถานี หมู่ที่ 1 ตำบลหลายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ยกระดับถนนดิน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 700 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,450 ลบ.ม. สัญญาจ้างเลขที่ 055/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 แล้วเสร็จวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รวม 90 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ - รวม - วัน ค่าก่อสร้าง 498,500.00 บาท ค่าปรับวันละ 494.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก ผู้รับจ้าง หจก.หลายโคกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

### คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตื้อไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน		เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย					
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
20	เร็ว	41 วัน (45.56 %)	1	-	-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายรัฐดิพงษ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสมพร เตื้อไธสง)

กรรมการฯ

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	ก่อสร้างยกระดับถนนดิน	100.00	20.00	-	20.00	20.00
	รวม	100.00		รวม		20.00

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
12 พฤศจิกายน 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
13 พฤศจิกายน 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
14 พฤศจิกายน 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
15 พฤศจิกายน 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
16 พฤศจิกายน 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
17 พฤศจิกายน 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
18 พฤศจิกายน 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	



บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก

วันที่	12	13	14	15	16	17	18
หัวหน้าคนงาน/ช่าง กรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	12	13	14	15	16	17	18
แจ่มใส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง หนัก						
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	12	13	14	15	16	17	18
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole							
รถเกรดเดอร์							
รถแทรกเตอร์							
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ							
รถเทเลอร์							
เครื่องมืองานปูน							
รวม	0	0	0	0	0	0	0



(นายรัฐพิงศ์ แคว้นไธสง)  
ผู้ควบคุมงาน



(นายสุวิทย์ ผิวขาว)  
ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร 88203/๒๐๕ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจวิปัสต (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 8 สัปดาห์ที่ 8/2565 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกหนองอุ่ม - ทางหลวงแผ่นดิน 202  
สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ยกระดับถนนดิน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 700  
เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,450 ลบ.ม. สัญญาจ้างเลขที่ 055/2565 ลงวันที่ 30  
กันยายน 2565 แล้วเสร็จวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รวม 90 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ - รวม - วัน  
ค่าก่อสร้าง 498,500.00 บาท ค่าปรับวันละ 494.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ผู้รับจ้าง หจก.หาย  
โศกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

### คณะกรรมการตรวจวิปัสต

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไรสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตือไรสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
20.00	เร็ว	34 วัน (37.78 %)	1	-	-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายฐิติพงศ์ แคว้นไรสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไรสง)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสมพร เตือไรสง)

กรรมการฯ

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	ก่อสร้างยกระดับถนนดิน	100.00	20.00	-	20.00	20.00
รวม		100.00	รวม			20.00

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้

---



---



---

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
19 พฤศจิกายน 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
20 พฤศจิกายน 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
21 พฤศจิกายน 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
22 พฤศจิกายน 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
23 พฤศจิกายน 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
24 พฤศจิกายน 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
25 พฤศจิกายน 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

## บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโตก

วันที่	19	20	21	22	23	24	25
หัวหน้าคนงาน/ช่าง กรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

## ตารางสภาพอากาศ

วันที่	19	20	21	22	23	24	25
แจ่มใส							
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง หนัก						
ฝนตกเวลา							

## บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	19	20	21	22	23	24	25
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole							
รถเกรดเดอร์							
รถแทรกเตอร์							
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ							
รถเทเลอร์							
เครื่องมืองานปูน							
รวม	0	0	0	0	0	0	0



(นายจิติพงศ์ แคว้นไชสง)

ผู้ควบคุมงาน



(นายสุวิทย์ ศิวขาว)

ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ที่ บร 88203/๒๖๕

วันที่ 2 ธันวาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 9 สัปดาห์ที่ 9/2565 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกหนองอ่อม - ทางหลวงแผ่นดิน 202 สถานี หมู่ที่ 1 ตำบลหลายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ยกระดับถนนดิน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 700 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,450 ลบ.ม. สัญญาจ้างเลขที่ 055/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 แล้วเสร็จวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รวม 90 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ - รวม - วัน ค่าก่อสร้าง 498,500.00 บาท ค่าปรับวันละ 494.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก ผู้รับจ้าง หจก. หลายโคกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

### คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตือไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
30	เร็ว	27 วัน (30 %)	1	-	-	-	-
					-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายรุตติพงศ์ แก้วนไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ (ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการฯ

(นางสมพร เตือไธสง)

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	ก่อสร้างยกระดับถนนดิน	100.00	20.00	10.00	30.00	30.00
	รวม	100.00	รวม			30.00

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้



วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
26 พฤศจิกายน 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
27 พฤศจิกายน 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
28 พฤศจิกายน 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
29 พฤศจิกายน 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
30 พฤศจิกายน 2565	[ ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ <input checked="" type="checkbox"/> ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ทำการถมดินเสริมระดับถนนพร้อมปรับเกลี่ยแน่น	
1 ธันวาคม 2565	[ ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ <input checked="" type="checkbox"/> ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ทำการถมดินเสริมระดับถนนพร้อมปรับเกลี่ยแน่น	
2 ธันวาคม 2565	[ ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ <input checked="" type="checkbox"/> ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ทำการถมดินเสริมระดับถนนพร้อมปรับเกลี่ยแน่น	

## บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

วันที่	26	27	28	29	30	1	2
หัวหน้าคนงาน/ช่าง					1	1	1
ขับรถ,กรรมกร					3	3	3
รวม	0	0	0	0	4	4	4

## ตารางสภาพอากาศ

วันที่	26	27	28	29	30	1	2
แจ่มใส	√	√	√	√	√	√	√
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							

## บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	26	27	28	29	30	1	2
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole					1	1	1
รถเกรดเตอร์					1	1	1
รถแทรกเตอร์					1	1	1
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ					3	3	3
รถเทเลอร์					1	1	1
เครื่องมืองานปูน							
รวม	0	0	0	0	7	7	7



(นายรัฐพงษ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน



(นายสุวิทย์ ศิวขยาว)

ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ที่ บร 88203/ *คช* วันที่ 9 ธันวาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 10 สัปดาห์ที่ 10/2561 ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกหนองอ่อม - ทางหลวงแผ่นดิน 202 สถานี หมู่ที่ 1 ตำบลหลายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ยกระดับถนนดิน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 700 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,450 ลบ.ม. สัญญาจ้างเลขที่ 055/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 แล้วเสร็จวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รวม 90 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง 498,500.00 บาท ค่าปรับวันละ 494.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก ผู้รับจ้าง หจก. หลายโคกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

### คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตื่อไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
60	เร็ว	20 วัน (30 %)	1	-	-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายรัฐพิงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสมพร เตื่อไธสง)

กรรมการฯ

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	ก่อสร้างยกระดับถนนดิน	100.00	30.00	30.00	60.00	60.00
	รวม	100.00	รวม			60.00

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
3 ธันวาคม 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เสริมดินปรับระดับถนนพร้อมปรับเกลี่ยแนบผิวจราจร	
4 ธันวาคม 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เสริมดินปรับระดับถนนพร้อมปรับเกลี่ยแนบผิวจราจร	
5 ธันวาคม 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เสริมดินปรับระดับถนนพร้อมปรับเกลี่ยแนบผิวจราจร	
6 ธันวาคม 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เสริมดินปรับระดับถนนพร้อมปรับเกลี่ยแนบผิวจราจร	
7 ธันวาคม 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เสริมดินปรับระดับถนนพร้อมปรับเกลี่ยแนบผิวจราจร	
8 ธันวาคม 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เสริมดินปรับระดับถนนพร้อมปรับเกลี่ยแนบผิวจราจร	
9 ธันวาคม 2565	[ <input checked="" type="checkbox"/> ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เสริมดินปรับระดับถนนพร้อมปรับเกลี่ยแนบผิวจราจร	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

วันที่	3	4	5	6	7	8	9
หัวหน้าคนงาน/ช่าง	1	1	1	1	1	1	1
กรรมกร	4	4	4	4	4	4	4
รวม	5	5	5	5	5	5	5

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	3	4	5	6	7	8	9
แจ่มใส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
หนัก							
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	3	4	5	6	7	8	9
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole	1	1	1	1	1	1	1
รถเกรดเดอร์	1	1	1	1	1	1	1
รถแทรกเตอร์	1	1	1	1	1	1	1
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ	5	5	5	5	5	5	5
รถเทเลอร์	1	1	1	1	1	1	1
เครื่องมืองานปูน							
รวม	9	9	9	9	9	9	9

  
 (นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)  
 ผู้ควบคุมงาน



(นายสุวิทย์ ผิวขาว)  
 ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ที่ บร 88203/๕๒๗ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 11 สัปดาห์ที่ 11/2565 ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกหนองอู่ม - ทางหลวงแผ่นดิน 202 สถานี หมู่ที่ 1 ตำบลหลายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ยกระดับถนนดิน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 700 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,450 ลบ.ม. สัญญาจ้างเลขที่ 055/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 แล้วเสร็จวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รวม 90 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ - รวม - วัน ค่าก่อสร้าง 498,500.00 บาท ค่าปรับวันละ 494.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก ผู้รับจ้าง หจก.หลายโคกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

### คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสาวสมพร เตื่อไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
60	แล้วเสร็จ	-	1	-	-	-	-
		-			-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายรัฐติพงษ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

(นางสมพร เตื่อไธสง)



ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	ก่อสร้างยกระดับถนนดิน	100.00	60.00	-	60.00	60.00
	<b>รวม</b>	<b>100.00</b>	<b>รวม</b>			<b>60.00</b>

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
10 ธันวาคม 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
11 ธันวาคม 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
12 ธันวาคม 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
13 ธันวาคม 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
14 ธันวาคม 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
15 ธันวาคม 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
16 ธันวาคม 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [ ] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

## บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก

วันที่	10	11	12	13	14	15	16
หัวหน้าคนงาน/ช่าง							
กรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

## ตารางสภาพอากาศ

วันที่	10	11	12	13	14	15	16
แจ่มใส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							

## บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	10	11	12	13	14	15	16
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole							
รถเกรดเดอร์							
รถแทรกเตอร์							
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ							
รถเทเลอร์							
เครื่องมืองานปูน							
รวม	0	0	0	0	0	0	0



(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน



(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร 88203/๒๖๖ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 12 สัปดาห์ที่ 12/2565 ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกหนองอ่อม - ทางหลวงแผ่นดิน 202 สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ยกระดับถนนดิน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 700 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,450 ลบ.ม. สัญญาจ้างเลขที่ 055/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 แล้วเสร็จวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รวม 90 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ - รวม - วัน ค่าก่อสร้าง 498,500.00 บาท ค่าปรับวันละ 494.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

### คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสาวสมพร เตื่อไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
80	เร็ว	6 วัน (6.67 %)	1	-	-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายจิตติพงษ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ (ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการฯ

(นางสมพร เตื่อไธสง)

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	ก่อสร้างยกระดับถนนดิน	100.00	60.00	20.00	80.00	80.00
	<b>รวม</b>	<b>100.00</b>	<b>รวม</b>			<b>80.00</b>

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
17 ธันวาคม 2565	[ ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [✓] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ปรับเกรดถนนดินตามระยะทางที่ไม่ได้เสริมดินตามระยะตามแบบ	
18 ธันวาคม 2565	[ ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [✓] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ปรับเกรดถนนดินตามระยะทางที่ไม่ได้เสริมดินตามระยะตามแบบ	
19 ธันวาคม 2565	[ ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [✓] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.0.60 เมตร ตามแบบระบุในพื้นที่ พร้อมฝังกลบดินหลังท่อระบายน้ำ	
20 ธันวาคม 2565	[ ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [✓] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.0.60 เมตร ตามแบบระบุในพื้นที่ พร้อมฝังกลบดินหลังท่อระบายน้ำ	
21 ธันวาคม 2565	[ ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [✓] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.0.60 เมตร ตามแบบระบุในพื้นที่ พร้อมฝังกลบดินหลังท่อระบายน้ำ	
22 ธันวาคม 2565	[ ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [✓] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.0.60 เมตร ตามแบบระบุในพื้นที่ พร้อมฝังกลบดินหลังท่อระบายน้ำ	
23 ธันวาคม 2565	[ ] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [✓] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.0.60 เมตร ตามแบบระบุในพื้นที่ พร้อมฝังกลบดินหลังท่อระบายน้ำ	

## บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

วันที่	17	18	19	20	21	22	23
หัวหน้าคนงาน/ช่าง	1	1	1	1	1	1	1
กรรมกร	4	1	4	4	4	4	4
รวม	5	2	5	5	5	5	5

## ตารางสภาพอากาศ

วันที่	17	18	19	20	21	22	23	
แจ่มใส	√	√	√	√	√	√	√	
ฝนตก	เล็กน้อย							
	ปานกลาง							
ฝนตกหนัก								
ฝนตกเวลา								

## บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	17	18	19	20	21	22	23
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole	1	1	1	1	1	1	1
รถเกรดเดอร์	1	1	1	1	1	1	1
รถแทรกเตอร์	1	1	1	1	1	1	1
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ	2	1	1	1	1	1	1
รถเทเลอร์	1	1	1	1	1	1	1
เครื่องมืองานปูน							
รวม	6	5	5	5	5	5	5



(นายรัฐติพงษ์ แคว้นโรง)

ผู้ควบคุมงาน



(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่

บร 88203/๒๕๖๕

วันที่ 30 ธันวาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 13 สัปดาห์ที่ 13/2565 ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกหนองอุ่ม - ทางหลวงแผ่นดิน 202 สถานี หมู่ที่ 1 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ยกระดับถนนดิน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 700 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,450 ลบ.ม. สัญญาจ้างเลขที่ 055/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 แล้วเสร็จวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รวม 90 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ - รวม - วัน ค่าก่อสร้าง 498,500.00 บาท ค่าปรับวันละ 494.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

### คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตือไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
80.00	เร็ว	-1 วัน (-1.11 %)	1	-	-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสมพร เตือไธสง)

กรรมการฯ



ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	ก่อสร้างยกระดับถนนดิน	100.00	80.00	20.00	100.00	100.00
	รวม	100.00	รวม			100.00

ปัญหา - อุปสรรค

 ไม่มี มี ดังนี้

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
24 ธันวาคม 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เกรดปรับเกลี่ยถนนผิวจราจรถนนดิน	
25 ธันวาคม 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เกรดปรับเกลี่ยถนนผิวจราจรถนนดิน	
26 ธันวาคม 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เกรดปรับเกลี่ยถนนผิวจราจรถนนดิน	
27 ธันวาคม 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เกรดปรับเกลี่ยถนนผิวจราจรถนนดิน	
28 ธันวาคม 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เกรดปรับเกลี่ยถนนผิวจราจรถนนดิน	
29 ธันวาคม 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เกรดปรับเกลี่ยถนนผิวจราจรถนนดินพร้อมเก็บรายละเอียดงาน ขนย้ายอุปกรณ์ในงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่ เสร็จสิ้นโครงการพร้อมส่งมอบงานจ้าง	
30 ธันวาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ เสร็จสิ้นโครงการ	

## บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่	24	25	26	27	28	29	30
หัวหน้าคนงานช่าง	1	1	1	1	1	1	
กรรมกร	4	5	5	5	5	4	
รวม	5	6	6	6	6	5	0

## ตารางสภาพอากาศ

วันที่	24	25	26	27	28	29	30
แจ่มใส	√	√	√	√	√	√	√
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
หนัก							
ฝนตกเวลา							

## บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	24	25	26	27	28	29	30
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole	1	1	1	1	1	1	
รถเกรดเดอร์	1	1	1	1	1	1	
รถแทรกเตอร์	1	1					
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ	1	1	1	1	1	1	
รถเทเลอร์	1	1	1	1	1	1	
เครื่องมืองานปูน							
รวม	5	5	4	4	4	4	0



(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน



(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง

# รูปถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกหนองอ่อม - ทางหลวงแผ่นดิน 202





(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการมอ.กองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

(ลงชื่อ)

1. นายวรพงษ์ วรกิจ




ประธานกรรมการ

2. นางสาววรรณภา ชีพไธสง



กรรมการ

3. นางสมพร เตื่อไธสง




กรรมการ

# รูปถ่ายขณะดำเนินการ

โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกหนองอู่ม - ทางหลวงแผ่นดิน 202



ห้างหุ้นส่วนจำกัด พหุโลกก่อสร้าง  
50 หมู่ 14 อ.พนาโพธิ์  
อ.พนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์  
H  
พหุโลกก่อสร้าง  
PHU LOK CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

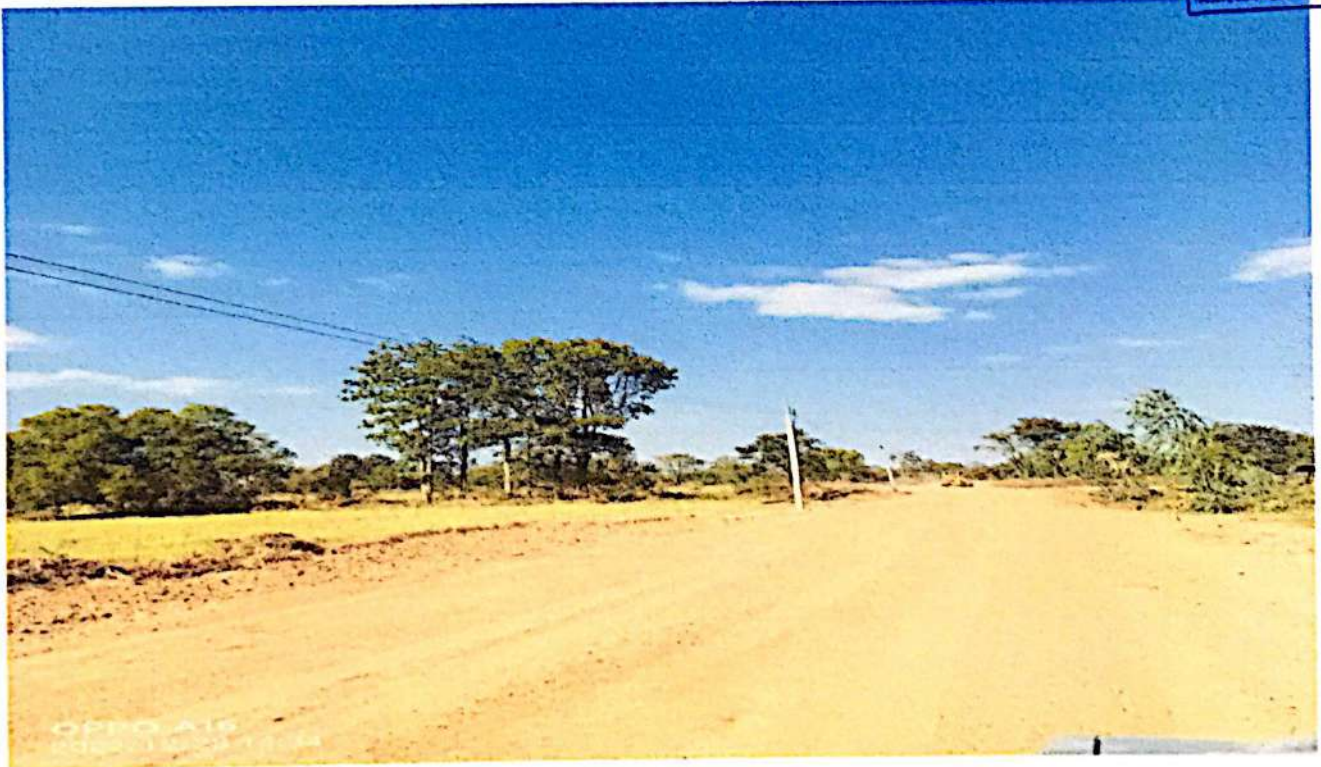

(ลงชื่อ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายจิติพงศ์ แคว้นโรสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง


(ลงชื่อ)

1. นายวรพงษ์ วรกิจ




ประธานกรรมการ

2. นางสาววรรณภา ชิพโรสง



กรรมการ

3. นางสมพร เตื่อโรสง



กรรมการ



รูปถ่ายขณะดำเนินการ

โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกหนองอุ่ม - ทางหลวงแผ่นดิน 202



ทีมงานบริษัท หาดใหญ่ก่อสร้าง  
หมู่ที่ 14  
หนองจิก  
H  
HA-S&S CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP



(ลงชื่อ)

(นายรัฐพงศ์ แคว้นไธสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง


คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

(ลงชื่อ)


1. นายวรพงษ์ วรกิจ

.....  ..... ประธานกรรมการ

2. นางสาววรรณภา ชีพไธสง

.....  ..... กรรมการ

3. นางสมพร เตือไธสง


.....  ..... กรรมการ

## รูปถ่ายดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 สายทางสี่แยกหนองอุ่ม - ทางหลวงแผ่นดิน 202



(ลงชื่อ)



(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการผอ.กองช่าง

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

(ลงชื่อ)

1. นายวรพงษ์ วรกิจ




ประธานกรรมการ

2. นางสาววรรณภา ชีพไธสง



กรรมการ

3. นางสมพร เตื่อไธสง



กรรมการ
