



องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

งานควบคุมงานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคสล.รห้สทาง บร.ถ. 204-010 สายทางบ้านชัยชนะ-บ้านดอนพยอม

หมู่ที่ 5 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนตุลาคม 2565

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์



สำเนาคู่มือ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๓๐๓/

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.

๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัยชนะ - บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัยชนะ - บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕ กับ หจก.หายโศก ก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายสุวิทย์ ผิวขาว เป็นผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล ทำการก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัยชนะ - บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอยายเวลาในการก่อสร้าง ดังกล่าวข้างต้นออกไป เนื่องจากฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำบริเวณดังกล่าวมากขึ้น และช่วงนี้เป็นฤดูฝน อาจมีฝนตกมาอีก ผู้รับจ้างจึงขอยายเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน จึงเห็นสมควรขอยายเวลาในการก่อสร้างออกไปอีก ๓๐ วัน ตามที่ผู้รับจ้างขอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หายโศก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมจิตย์ ชัยก่า)

รองปลัด อบต.หายโศก

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงษ์ วรกิจ)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสมพร เตือโฮสง)
ผู้อำนวยการกองการสวัสดิการสังคม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
นางสมพร กอคุณกลาง

(ลงชื่อ).....
(นางสมพร กอคุณกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก .

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
ดำเนินกร ตงทังโค

(ลงชื่อ).....
(นางระวี พยุงแสนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๓๐๓/ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัยชนะ - บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัยชนะ - บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕ กับ หจก.หายโศก ก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายสุวิทย์ ผิวขาว เป็นผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล ทำการก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัยชนะ - บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอยายเวลาในการก่อสร้าง ดังกล่าวข้างต้นออกไป เนื่องจากฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำบริเวณดังกล่าวมากขึ้น และช่วงนี้เป็นฤดูฝน อาจมีฝนตกมาอีก ผู้รับจ้างจึงขอยายเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน จึงเห็นสมควรขอยายเวลาในการก่อสร้างออกไปอีก ๓๐ วัน ตามที่ผู้รับจ้างขอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หายโศก

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

นางสมพร กอคุณกลาง



(ลงชื่อ).....

(นางสมพร กอคุณกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ดร.นิพนธ์ กอคุณกลาง

(ลงชื่อ).....

(นางระวี พยุงแสนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๖๓ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัยชนะ - บ้านดอนพะยอม สัปดาห์ที่ ๑

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๑ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัยชนะ - บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๙๒.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๐.๐๐%	ตาม แผนงาน	๕๘ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๐.๕๐	-	-	-	-
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	-	-	-	-
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	-	-	-
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-

ปัญหา - อุปสรรค

 ไม่มี มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่	-	-	-	-	-	๑๙	๒๐
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถขุดดิน	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)



(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ช้ายคำ.....ประธานฯ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ.....กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไธสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัย

ชนะ - บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๗ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน	แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน	๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน	๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน	๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โทธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัยชนะ - บ้านดอนพะยอม สัปดาห์ที่ ๒

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๒ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัยชนะ - บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๗ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๙๒.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๐.๐๐%	ตาม แผนงาน	๕๑ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๐.๕๐	-	-	-	-
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	-	-	-	-
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	-	-	-
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถขุดดิน	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุรทศ ผวีขาว)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ช้ายท่า.....ประธานฯ

๒. นายวรพงษ์ วรกีจ.....กรรมการ

๓. นางสาวสมพร เตื่อไรสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัย
ชนะ - บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๗ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓๓๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐

สายทางบ้านชัยชนะ - บ้านดอนพะยอม สัปดาห์ที่ ๓

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๓ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัย

ชนะ - บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่

น้อยกว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - - รวม - - วัน

ค่าก่อสร้าง ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๙๒.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๐.๐๐%	ตาม แผนงาน	๔๔ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๐.๕๐	-	-	-	-
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	-	-	-	-
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	-	-	-
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๑ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๓ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕

วันที่	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๑	๒	๓
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถขุดดิน	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)


(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ชัยคำ.....ประธานฯ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ.....กรรมการ

๓. นางสาวสมพร เตือโรสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัย

ชนะ - บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างทอ.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๗ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ พร ๘๘๒๐๓/๖๖ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัยชนะ - บ้านดอนพะยอม สัปดาห์ที่ ๔

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๔ สัปดาห์ที่ ๔ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัยชนะ - บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๙๒.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๐.๐๐%	ตาม แผนงาน	๓๗ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๐.๕๐	-	-	-	-
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	-	-	-	-
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	-	-	-
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๔ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๕ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๖ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๗ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๘ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๙ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๑๐ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน กันยายน ๒๕๖๕

วันที่	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถขุดดิน	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัด)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ชัยคำ.....ประธานฯ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ.....กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไธสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัย
ชนะ - บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๗ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก
ที่ บร ๘๘๒๐๓๗๒๒ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐
สายทางบ้านชัยชนะ - บ้านดอนพะยอม สัปดาห์ที่ ๕

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๕ สัปดาห์ที่ ๕ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัย
ชนะ - บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่
น้อยกว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๗ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๙๒.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ผู้รับจ้าง หจก. ห้วยโคกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๐.๐๐%	ตาม แผนงาน	๓๐ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเกลี้ยคันทางเดิม	๐.๕๐	-	-	-	-
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	-	-	-	-
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	-	-	-
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-

ไม่มี มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑๑ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๑๒ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๑๓ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๑๔ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๑๕ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๑๖ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๑๗ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕

วันที่	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถขุดดิน	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)



(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ วัฒนวิเศษ)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ชัยก่า.....ประธานฯ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ.....กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไธสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัย

ชนะ - บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๗ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โทธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๖๓๒ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัยชนะ - บ้านดอนพะยอม สัปดาห์ที่ ๖

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๖ สัปดาห์ที่ ๖ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัยชนะ - บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๗ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๙๒.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๐.๐๐%	ตาม แผนงาน	๒๓ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๐.๕๐	-	-	-	-
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	-	-	-	-
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	-	-	-
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-

ปัญหา - อุปสรรค

 ไม่มี มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑๘ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๑๙ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๐ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๑ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๒ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๓ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๔ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕

วันที่	๑๘	๑๙	๒๐	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถขุดดิน	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ผัวขาว)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ช้ายก่า.....ประธานฯ

๒. นายวรพงษ์ วรกีจ.....กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไธสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัย
ชนะ - บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๗ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๑๗๖ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัยชนะ - บ้านดอนพะยอม สัปดาห์ที่ ๗

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๗ สัปดาห์ที่ ๗ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัยชนะ - บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๙๒.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๐.๐๐%	ตาม แผนงาน	๑๖ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๐.๕๐	-	-	-	-
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	-	-	-	-
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	-	-	-
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๒๕ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๖ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๗ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๘ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๙ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน กันยายน ๒๕๖๕

วันที่	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๑
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถขุดดิน	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ชัยคำ.....ประธานฯ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ.....กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไธสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัย
ชนะ - บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๗ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ พร ๘๘๒๐๓/ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัยชนะ - บ้านดอนพะยอม สัปดาห์ที่ ๘

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๘ สัปดาห์ที่ ๘ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัยชนะ - บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลหายโศก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๙๒.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๐.๐๐%	ตาม แผนงาน	๑๐ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๐.๕๐	-	-	-	-
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	-	-	-	-
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	-	-	-
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๒ ตุลาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๓ ตุลาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๔ ตุลาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๕ ตุลาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน กันยายน ๒๕๖๕

วันที่	๒	๓	๔	๕			
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-			
คนงาน	-	-	-	-			
รถผสมปูน	-	-	-	-			
รถขุดดิน	-	-	-	-			
รถไถ	-	-	-	-			
รวม	-	-	-	-			

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์)

ผู้รับจ้าง



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ช้ายก่า.....ประธานฯ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ.....กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไธสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔ - ๐๑๐ สายทางบ้านชัย
ชนะ - บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนพะยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๗ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน	แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน	๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน	๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน	๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โทธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ที่ บร 82303/๑๒๓/

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้าง

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานประจำเดือน ตุลาคม 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคสล.รหัสทาง บร.ถ. 204-010 สายทางบ้านชัยชนะ-บ้านดอนพยอม สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหลายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 218 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย 872 ตารางเมตร สัญญาจ้างเลขที่ 047/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวม 60 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 รวม 30 วัน ค่าก่อสร้าง 492,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 492.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก ผู้รับจ้าง หจก.หลายโคกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตื่อไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0	ยังไม่ทำงาน	-14 วัน (-23.33 %)	1	-	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

(นางสมพร เตื่อไธสง)

กรรมการฯ

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

ก่อสร้างถนนคสล.รห้สทาง บร.ถ. 204-010 สายทางบ้านชัยชนะ-บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์



1 ข้อมูลเกี่ยวกับงาน

1.1 ผู้ดำเนินการ

ผู้ว่าจ้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
ผู้ออกแบบ	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
ผู้รับจ้าง	หจก.หายโศกก่อสร้าง
สถานที่ตั้ง	เลขที่ 50 หมู่ 14 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

1.2 สัญญาจ้าง

ชื่อสัญญา	ก่อสร้างถนนคสล.รหีสทาง บร.ถ. 204-010 สายทางบ้านชัยชนะ-บ้านดอนพยอม	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	
สัญญาจ้างเลขที่	047/2565	ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565
เริ่มสัญญาจ้าง	19 สิงหาคม 2565	
สิ้นสุดสัญญาจ้าง	17 ตุลาคม 2565	
ระยะเวลาก่อสร้างรวม	60	วัน
จำนวนงวดงานตามสัญญา	1	งวด
ต่อสัญญาถึงวันที่	16 พฤศจิกายน 2565	
รวมระยะเวลาที่ต่อสัญญา	30 วัน	
ราคาค่าก่อสร้าง	492,000.00 บาท	
ค่าปรับวันละ	492.00 บาท	

1.3 ลักษณะและขอบเขตงาน

งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคสล.รหีสทาง บร.ถ. 204-010 สายทางบ้านชัยชนะ-บ้านดอนพยอมผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 218 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
-------------	---

1.4 คณะกรรมการตรวจการจ้าง

1	นายวรพงษ์ วรกิจ	ประธานกรรมการ
2	นางสาววรรณภา ซีพไธสง	กรรมการ
3	นางสมพร เตื่อไธสง	กรรมการ

1.5 ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

1	นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง	ผู้ควบคุมงาน
---	-----------------------	--------------

1.6 ผู้แทนผู้ว่าจ้าง

นายสุวิทย์ ผิวขาว

5 ปัญหา/อุปสรรคในการก่อสร้าง

[] ไม่มี

[✓] มี รายละเอียดดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ที่	ปัญหา - อุปสรรค - การแก้ไข	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน	[] แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการ [✓] รายงานประชาชน
2	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน	[] แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการ [✓] รายงานประชาชน
3	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน	[] แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการ [✓] รายงานประชาชน
4	โครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน	[] แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการ [✓] รายงานประชาชน

6 สรุปผลการดำเนินงานถึงปัจจุบัน

6.1 ผลการก่อสร้างประจำเดือน	0.00	%	
6.2 ผลงานก่อสร้างรวมถึงปัจจุบัน	0.00	%	
6.3 ผลงานก่อสร้างตามแผน	0.00	%	
6.4 ผลการก่อสร้าง			
[] เป็นไปตามแผนงาน	0.00	%	
6.5 ระยะเวลาก่อสร้างคงเหลือ	-14	วัน	
6.6 งานก่อสร้างแล้วเสร็จรวม	-	งวด	คิดเป็นมูลค่างาน - %

(ลงชื่อ) 
(นายรัฐติพงษ์ แคว้นไชสง)

ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ที่ บร 88203/๑๖๓๓ วันที่ 16 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 178(4)

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก ที่ 214/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 047/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ว่าจ้าง หจก.หลายโคกก่อสร้าง ทำนบก่อสร้างถนนคสล.รหัทสทาง บร.ถ. 204-010 สายทางบ้านชัยชนะ-บ้านดอนพยอม สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหลายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดเริ่มทำงานจ้างวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และกำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ค่างาน 492,000.00.- บาท(-สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) นั้น

ผู้ควบคุมงานเมื่อได้รับทราบคำสั่ง/รายละเอียดของสัญญา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แล้วได้เข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ปรากฏว่าผู้รับจ้าง

- [] ยังไม่เข้าดำเนินการ ณ สถานที่ก่อสร้าง
 - [] เข้าดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่-..... ซึ่ง
 - () เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา
 - () เกินข้อกำหนดของสัญญา จำนวน.....14.....วัน
- โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายรัฐติพงษ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสมพร เตื้อไธสง)

กรรมการฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ที่ บร 88203/๖๖๔

วันที่ 17 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 9 สัปดาห์ที่ 9/2561 ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคสล.รหัสทาง บร.ถ. 204-010 สายทางบ้านชัยชนะ-บ้านดอนพยอม สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหลายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 218 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย 872 ตารางเมตร สัญญาจ้างเลขที่ 047/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวม 60 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 รวม 30 วัน ค่าก่อสร้าง 492,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 492.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก ผู้รับจ้าง หจก.หลายโคกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการ
- 3 นางสมพร เตื่อไธสง กรรมการ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0	ยังไม่ทำงาน	2 วัน (3.33 %)	1	-	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายรัฐติพงษ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ


(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการ

(นางสมพร เตื่อไธสง)

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ โครงการก่อสร้างฝิวจรรยาจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านชัยชนะ-บ้านดอนพยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์

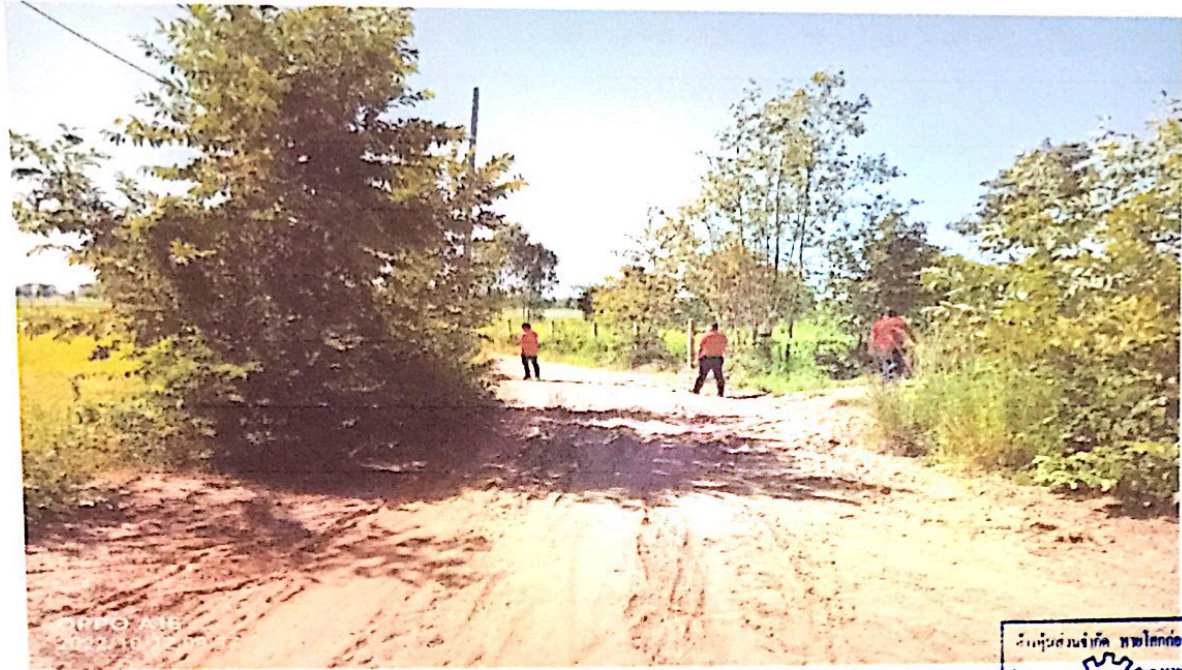

(ลงชื่อ)



(นายรัฐติพงษ์ แคว้นไธสง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง

(ลงชื่อ)

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ.....ประธานกรรมการ



๒. นางสาววรรณภา ชีพไธสง.....กรรมการ



๓. นางสมพร เตื่อไธสง.....กรรมการ



วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
9 ตุลาคม 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
10 ตุลาคม 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
11 ตุลาคม 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
12 ตุลาคม 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
13 ตุลาคม 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
14 ตุลาคม 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
15 ตุลาคม 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลายไทร

วันที่	9	10	11	12	13	14	15
หัวหน้างาน/ช่าง							
กรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	9	10	11	12	13	14	15
แจ่มใส							
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	9	10	11	12	13	14	15
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รวม	0	0	0	0	0	0	0



(นายรัฐพงษ์ แคว้นไชสง)

ผู้ควบคุมงาน



(นายสุวิทย์ ฝักขาว)

ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร 88203/๑๖๕ วันที่ 24 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 10 สัปดาห์ที่ 10/2565 ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคสล.รหส์ทาง บร.ถ. 204-010 สายทางบ้านชัยชนะ-บ้านดอนพยอม สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหายโศก อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 218 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย 872 ตารางเมตร สัญญาจ้างเลขที่ 047/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวม 60 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 รวม 30 วัน ค่าก่อสร้าง 492,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 492.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไชสง กรรมการฯ
- 3 นางสาวสมพร เตื่อไชสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
0	ยังไม่ทำงาน	-5 วัน (-8.33 %)	1	-	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายฐิติพงศ์ แคว้นไชสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)


กรรมการฯ (ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไชสง)

(นางสมพร เตื่อไชสง)

กรรมการฯ


ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านชัยชนะ-บ้านดอนพยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลหายโศก อำเภอบุโขยง จังหวัดบุรีรัมย์

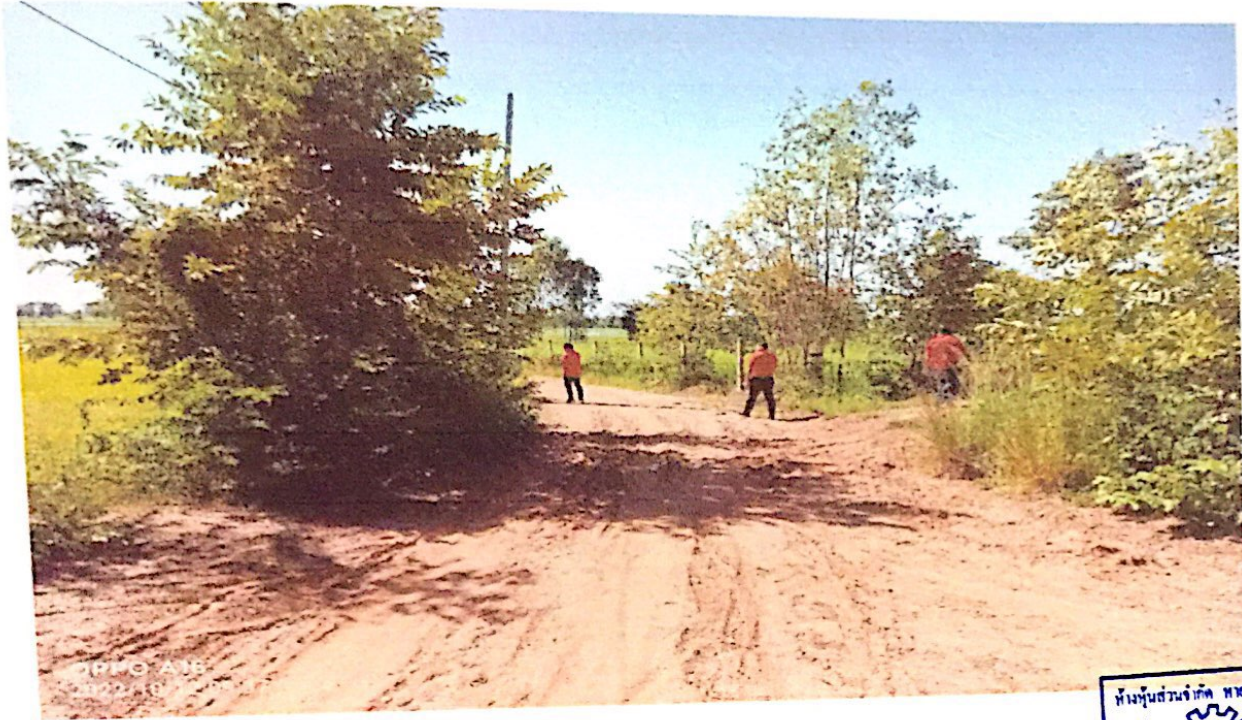

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดทรายก่อสร้าง
50 หมู่ 14 ต.หายโศก
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
HAASKE CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP



(ลงชื่อ)



(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)


นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง

(ลงชื่อ)

๑.นายวรพงษ์ วรกิจ..........ประธานกรรมการ

๒.นางสาววรรณภา ชีพไธสง..........กรรมการ

๓.นางสมพร เตื่อไธสง..........กรรมการ

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
16 ตุลาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
17 ตุลาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
18 ตุลาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
19 ตุลาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
20 ตุลาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
21 ตุลาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
22 ตุลาคม 2565	[<input checked="" type="checkbox"/>] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่	16	17	18	19	20	21	22
หัวหน้าคนงานช่าง กรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	16	17	18	19	20	21	22
แจ่มใส							
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							


บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	16	17	18	19	20	21	22
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รวม	0	0	0	0	0	0	0



(นายรัฐติพงษ์ แคว้นไธสง)


ผู้ควบคุมงาน



(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านชัยชนะ-บ้านดอนพยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดบุรีรัมย์

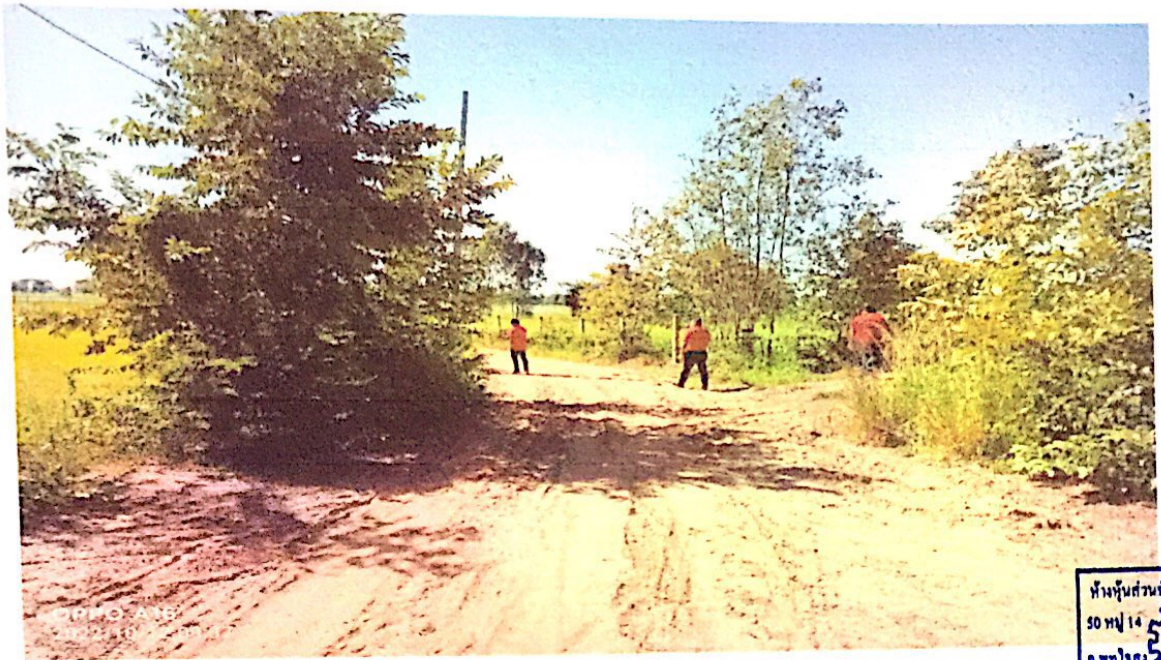

(ลงชื่อ)

(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง

(ลงชื่อ)

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ.....ประธานกรรมการ

๒. นางสาววรรณภา ชีพไธสง.....กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไธสง.....กรรมการ

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
23 ตุลาคม 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
24 ตุลาคม 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
25 ตุลาคม 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
26 ตุลาคม 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
27 ตุลาคม 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
28 ตุลาคม 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
29 ตุลาคม 2565	[✓] ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง [] ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก

วันที่	23	24	25	26	27	28	29
หัวหน้าคนงาน/ช่าง กรรมกร							
รวม	0	0	0	0	0	0	0

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	23	24	25	26	27	28	29
แจ่มใส							
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							


บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	23	24	25	26	27	28	29
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รวม	0	0	0	0	0	0	0



(นายรัฐติพงษ์ แคว้นโฮง)

ผู้ควบคุมงาน



ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร. 88203/๑๙๒ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานวันถึงกำหนดส่งมอบงานของผู้รับจ้างตามข้อกำหนดของสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 178(4)

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ 214/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 047/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ว่าจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้างทำงานก่อสร้างถนนคสล.รหัทสทาง บร.ถ. 204-010 สายทางบ้านชัยชนะ-บ้านดอนพยอม สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหายโศก อำเภอพุนพิน จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดเริ่มทำงานจ้างวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และกำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ค่างาน 492,000.00.- บาท(-สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามสัญญาจ้างและส่งมอบงวดงานจ้างแล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โดยผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง เนื่องจากล่าช้ากว่าวันที่กำหนดในสัญญาจ้าง ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 17 ตุลาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสมพร เตื่อไธสง)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร. 88203/๒๕๖๑ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 178(4)

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ 214/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้ง ข้าพเจ้า เป็นผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 047/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ว่าจ้าง หจก.หายโศก ก่อสร้าง ทำงานก่อสร้างถนนคสล.รหัสทาง บร.ถ. 204-010 สายทางบ้านชัยชนะ-บ้านดอนพยอม สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหายโศก อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดเริ่มทำงานจ้างวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และกำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ค่างาน 492,000.00.- บาท(-สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

ผู้ควบคุมงานเมื่อได้รับทราบคำสั่ง/รายละเอียดของสัญญา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แล้วได้เข้า ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ปรากฏว่าผู้รับจ้าง

- [] ยังไม่เข้าดำเนินการ ณ สถานที่ก่อสร้าง
- [✓] เข้าดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ซึ่ง
- () เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา
- (✓) เกินข้อกำหนดของสัญญา จำนวน.....14.....วัน
- โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายรัฐพิงศ์ แคว้นโรสง)

ผู้ควบคุมงาน

- ทราบ

-

(ลงชื่อ)

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพโรสง)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสมพร เตื่อโรสง)

กรรมการฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ที่ บร. 88203/๑๔๖

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายวรพงษ์ วรกิจ)

รายงานครั้งที่ 12 สัปดาห์ที่ 12/2565 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคสล.รหัททาง บร.ถ. 204-010 สายทางบ้านชัยชนะ-บ้านดอนพยอม สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหลายโคก อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 218 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย 872 ตารางเมตร สัญญาจ้างเลขที่ 047/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวม 60 วัน ต่อสัญญาจ้างจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 รวม 30 วัน ค่าก่อสร้าง 492,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 492.00 บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก ผู้รับจ้าง หจก.หลายโคกก่อสร้าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 1 นายวรพงษ์ วรกิจ ประธานกรรมการฯ
- 2 นางสาววรรณภา ชีพไธสง กรรมการฯ
- 3 นางสมพร เตือไธสง กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
100	แล้วเสร็จ	-	1	-	-	-	-
		-			-	-	-
					รวม	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายรัฐติพงษ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

.....

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

กรรมการฯ (ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นางสมพร เตือไธสง)

กรรมการฯ

วัน เดือน ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
30 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้	
31 ตุลาคม 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ขนย้ายเครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้างเข้าพื้นที่โครงการ งานปรับเกลี่ยพื้นที่ก่อสร้างพร้อมปรับเกลี่ยผิวทางที่จะก่อสร้าง ลงทรายรองพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย,ตีแบบถนนวางเหล็กเสริมคอนกรีต เทคอนกรีตถนน	Slump Test คอนกรีต เก็บตัวอย่างลูกปูน 3 ตัวอย่าง
1 พฤศจิกายน 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ลงทรายรองพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย,ตีแบบถนนวางเหล็กเสริมคอนกรีต เทคอนกรีตถนน พร้อมทำการบ่มคอนกรีต	Slump Test คอนกรีต
2 พฤศจิกายน 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตีแบบถนนวางเหล็กเสริมคอนกรีต เทคอนกรีตถนน พร้อมทำการบ่มคอนกรีต	Slump Test คอนกรีต
3 พฤศจิกายน 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ลงทรายรองพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย,ตีแบบถนนวางเหล็กเสริมคอนกรีต เทคอนกรีตถนน พร้อมทำการบ่มคอนกรีต	Slump Test คอนกรีต เก็บตัวอย่างลูกปูน 3 ตัวอย่าง
4 พฤศจิกายน 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ลงทรายรองพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย,ตีแบบถนนวางเหล็กเสริมคอนกรีต เทคอนกรีตถนน เทคอนกรีตถนนแล้วเสร็จ พร้อมทำการบ่มคอนกรีต	Slump Test คอนกรีต เก็บตัวอย่างลูกปูน 3 ตัวอย่าง
5 พฤศจิกายน 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการทำงานของผู้รับจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> ผู้รับจ้างทำงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ หยอดยางมะตอยรอยต่อถนนคอนกรีต ลงหินคลุกไหล่ทางถนนคอนกรีต เก็บรายละเอียดงาน ขนย้ายอุปกรณ์ก่อสร้างออกจากพื้นที่โครงการ เสร็จสิ้นโครงการ	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

วันที่	30	31	1	2	3	4	5
หัวหน้าคนงาน/ช่าง	0	1	1	1	1	1	1
กรรมกร	0	10	12	9	11	11	12
รวม	0	11	13	10	12	12	13

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	30	31	1	2	3	4	5
แจ่มใส		✓	✓	✓	✓	✓	✓
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
หนัก							
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

วันที่	30	31	1	2	3	4	5
รายการ	จำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์						
รถขุด Backhole							
รถเกรดเดอร์							
รถแทรกเตอร์		1	1	1	1	1	1
รถปูน Ready Mixed		5	5	5	5	5	5
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ		2	2	2	2	2	2
รถเทเลอร์		1	1	1	1	1	1
เครื่องมืองานปูน		6	6	6	6	6	6
รวม	0	15	15	15	15	15	15


 (นายจิติพงศ์ แคว้นไชสง)
 ผู้ควบคุมงาน



(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก


ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนงาน (%)	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
1	งานปรับเทียบถนนลงทรายรองพื้นถนนตีแบบถนน	100.00	-	50.00	50.00	50.00
2	วางเหล็กเสริมถนน เทคอนกรีตถนน	100.00	-	50.00	50.00	50.00
รวม		200.00	รวม			100.00

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านชัยชนะ-บ้านดอนพยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

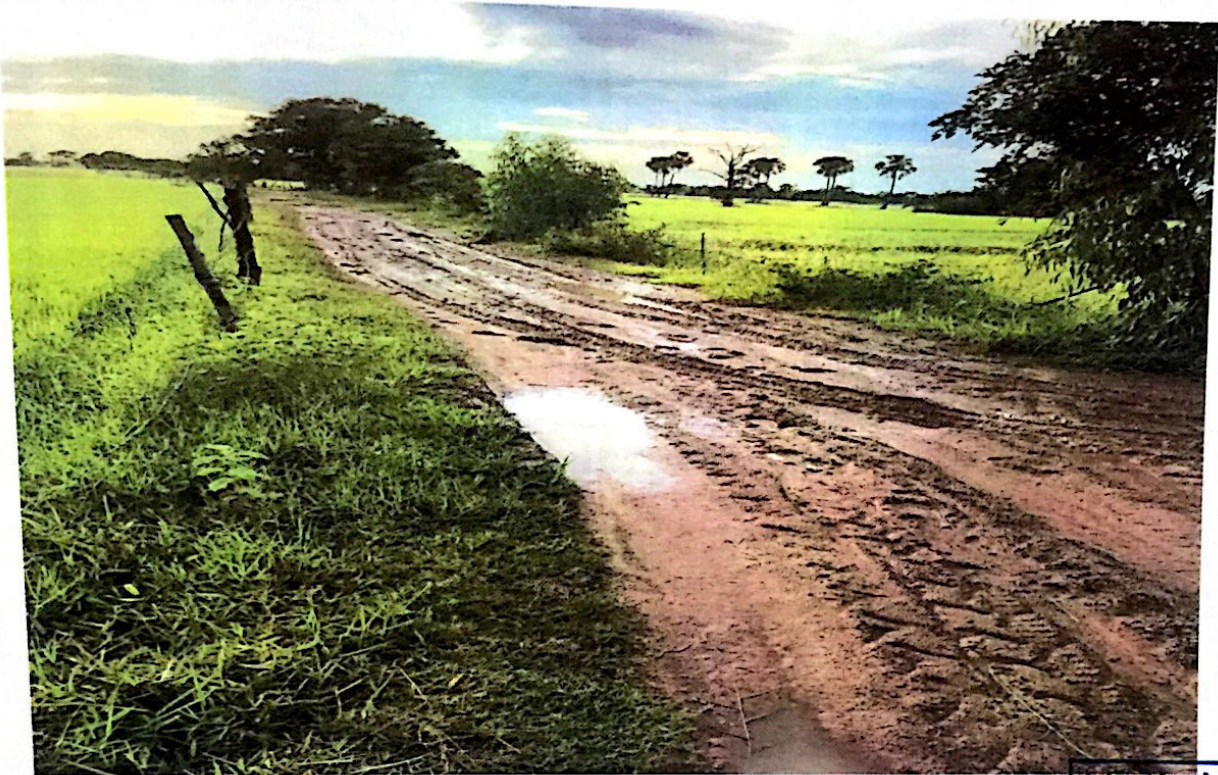

(ลงชื่อ)



(นายรัฐติพงษ์ แคว้นไธสง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง


(ลงชื่อ)

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ..........ประธานกรรมการ

๒. นางสาววรรณภา ชีพไธสง..........กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไธสง..........กรรมการ

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านชัยชนะ-บ้านดอนพยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลหายโศก อำเภอฟุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

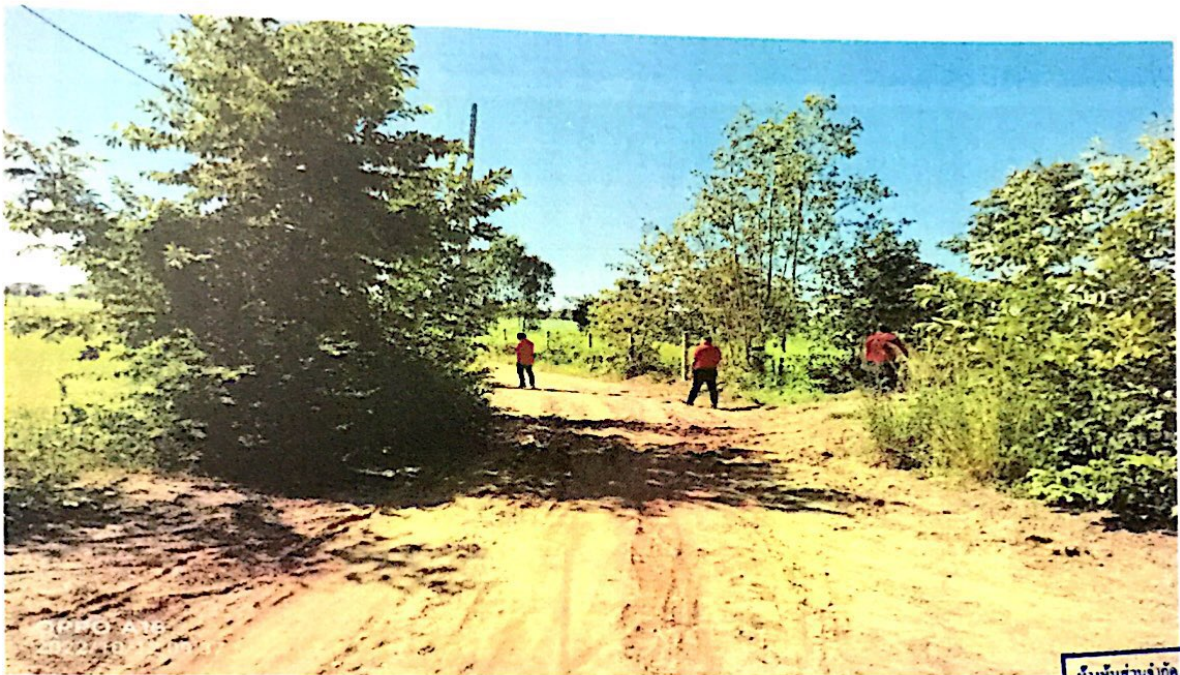

(ลงชื่อ)



(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง


(ลงชื่อ)

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ..........ประธานกรรมการ

๒. นางสาววรรณภา ชีพไธสง..........กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไธสง..........กรรมการ

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านชัยชนะ-บ้านดอนพยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยโศก อำเภอบัวไร่ จังหวัดบุรีรัมย์

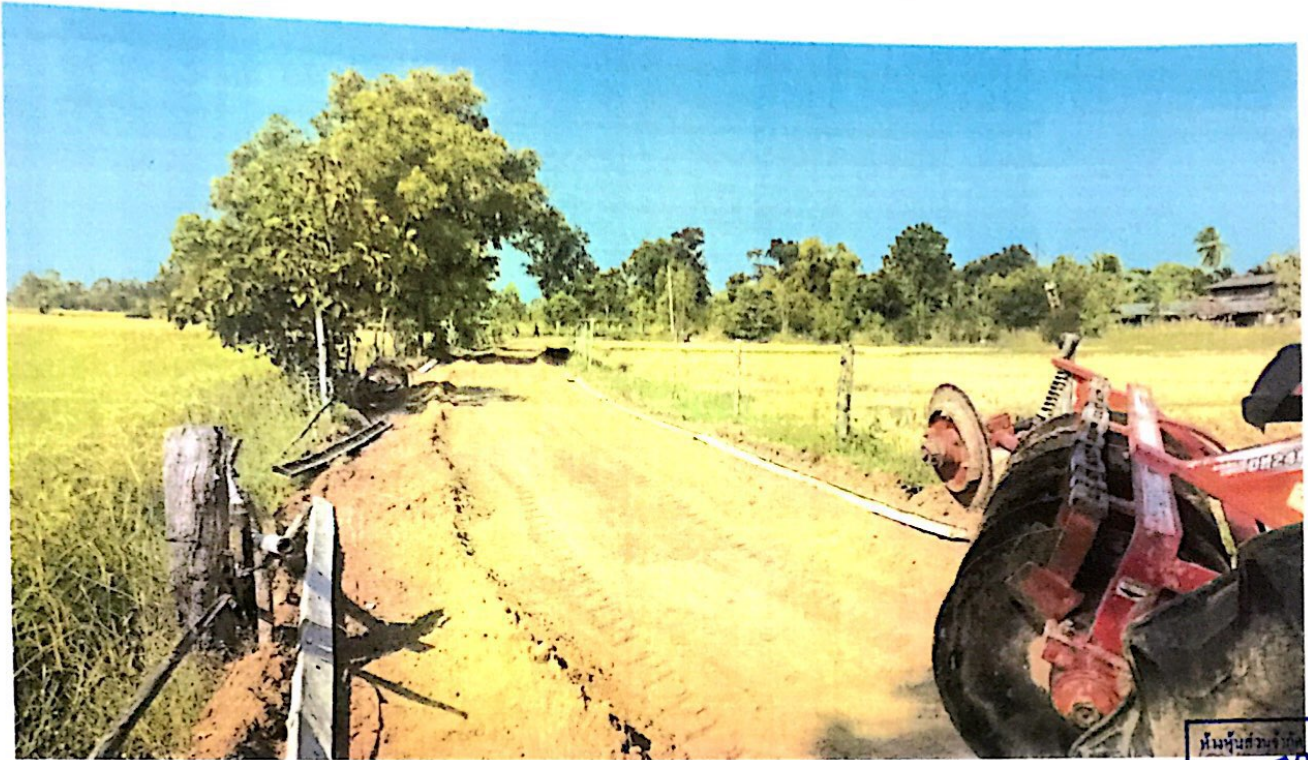

(ลงชื่อ) 

(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง


(ลงชื่อ)


๑.นายวรพงษ์ วรกิจ..........ประธานกรรมการ

๒.นางสาววรรณภา ชีพไธสง..........กรรมการ

๓.นางสมพร เตื่อไธสง..........กรรมการ

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านชัยชนะ-บ้านดอนพยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยโตก อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดบุรีรัมย์

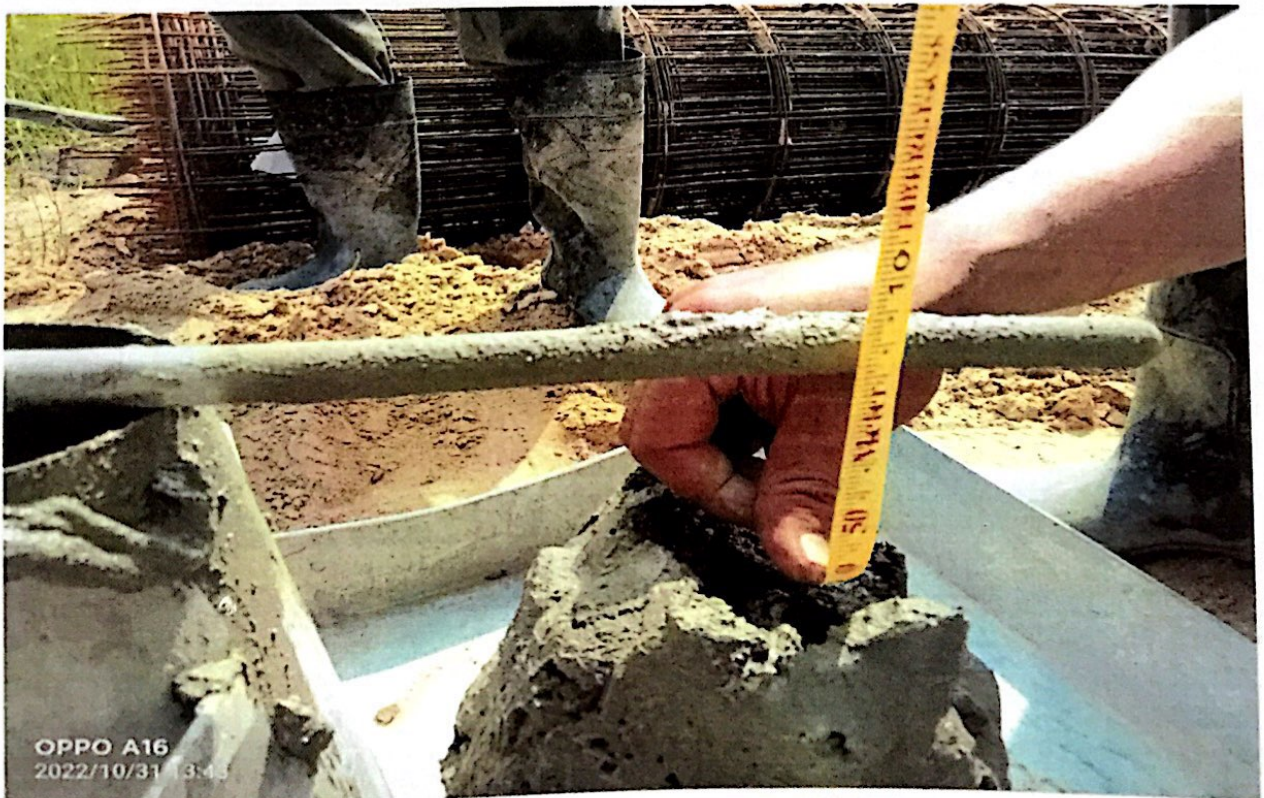

(ลงชื่อ) 
(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง

(ลงชื่อ)

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ..........ประธานกรรมการ


๒. นางสาววรรณภา ชีพไธสง..........กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไธสง..........กรรมการ

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านชัยชนะ-บ้านดอนพยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยโศก อำเภอบัวไร่ จังหวัดบุรีรัมย์



(ลงชื่อ)



(นายรัฐติพงษ์ แคว้นไธสง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง

(ลงชื่อ)

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ..........ประธานกรรมการ

๒. นางสาววรรณภา ชีพไธสง..........กรรมการ

๓. นางสมพร เตื้อไธสง..........กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง

(ลงชื่อ)

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ..........ประธานกรรมการ

๒. นางสาววรรณภา ชีพไธสง..........กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไธสง..........กรรมการ
